

# VA-handlingsplan

Del i VA-plan för Stenungsunds kommun



Stenungsunds  
kommun

Fastställsedatum: 2024-03-07 § 27  
Diarienummer: 2023/455  
Reviderad 2023-12-04  
Beslut av: Kommunfullmäktige  
Dokumentansvarig: Strategisk processledare Infrastruktur  
Giltighetstid: Till vidare  
Revideras: Minst vart 4:e år  
Följs upp av: Infrastruktur  
Typ av dokument: Plan

# Innehållsförteckning

|                                                           |    |
|-----------------------------------------------------------|----|
| 1 Inledning .....                                         | 5  |
| 1.1 Strategisk VA-planering i Stenungsunds kommun .....   | 5  |
| 1.1.3 Identifierade utmaningar enligt VA-översikten ..... | 7  |
| 1.1.2 Målbild och ställningstaganden .....                | 8  |
| 1.2 Metod och avgränsning .....                           | 9  |
| 2 Åtgärder .....                                          | 10 |
| 2.1 Övergripande .....                                    | 11 |
| 2.2 Allmän VA-försörjning .....                           | 14 |
| 2.2.1 Dricksvatten .....                                  | 14 |
| 2.2.2 Spillvatten .....                                   | 16 |
| 2.3 Enskild VA-försörjning .....                          | 17 |
| 2.4 Dagvatten och skyfall .....                           | 18 |
| 3 Genomförande och uppföljning .....                      | 19 |
| 3.1 Genomförande .....                                    | 19 |
| 3.2 Uppföljning .....                                     | 20 |

Bilaga 1. Åtgärdslista



Stenungsunds  
kommun

## Kontakt

Lisa Chohan Strömner

[lisa.chohan-stromner@stenungsund.se](mailto:lisa.chohan-stromner@stenungsund.se)

[www.stenungsund.se](http://www.stenungsund.se)

# 1 Inledning


## 1.1 Strategisk VA-planering i Stenungsunds kommun

Syftet med den strategiska VA-planen (vatten och avlopp) som Stenungsunds kommun tagit fram är att tydliggöra hur kommunen avser att arbeta långsiktigt med vattenförsörjning samt hantering av dag- och spillvatten, vidare kallat VA-försörjning.

VA-planen består av fyra delar; VA-översikt, VA-policy, VA-handlingsplan och Vattentjänstplan. Arbetet har genomförts i flera steg i enlighet med Havs- och vattenmyndighetens rekommendationer<sup>1</sup> (se Figur 1). I VA-översikten har nuläget beskrivits tillsammans med en sammanställning av kommunens utmaningar och behov. Med dessa som utgångspunkt upprättades en VA-policy med målbild och tillhörande ställningstaganden. Arbetet har utförts i nära samarbete mellan kommunens styrgrupp, arbetsgrupp och politiker samt Sweco som processledare och författare av VA-planen. Detta dokument är kommunens VA-handlingsplan vars syfte är att tydliggöra vilka åtgärder som krävs för att ta sig från nuläget som beskrivs i översikten till den målbild som definierats i VA-policyn. 1 januari 2023 inträdde ett lagkrav i Lagen om allmänna vattentjänster om att alla kommuner senast 1 januari 2024 ska tagit fram en vattentjänstplan. De delar i tidigare VA-handlingsplan som berörde den långsiktiga planeringen av VA-utbyggnad har flyttats från VA-handlingsplanen till Vattentjänstplanen. VA-handlingsplanen och vattentjänstplanen är därmed två parallella dokument som båda omfattar kommunens långsiktiga planering. VA-handlingsplanen innehåller beskrivning av den strategiska VA-planeringen, åtgärder för att gå från nuläge till målbild samt beskrivning av genomförande och uppföljning av VA-planen. Vattentjänstplanen innehåller kommunens långsiktiga planering av hur behovet av allmänna vattentjänster ska tillgodoses samt en skyfallsanalys som beskriver vilka åtgärder som behöver vidtas för att de allmänna VA-anläggningarna ska fungera vid en ökad belastning på grund av skyfall.

---


<sup>1</sup> Havs- och vattenmyndigheten, 2014

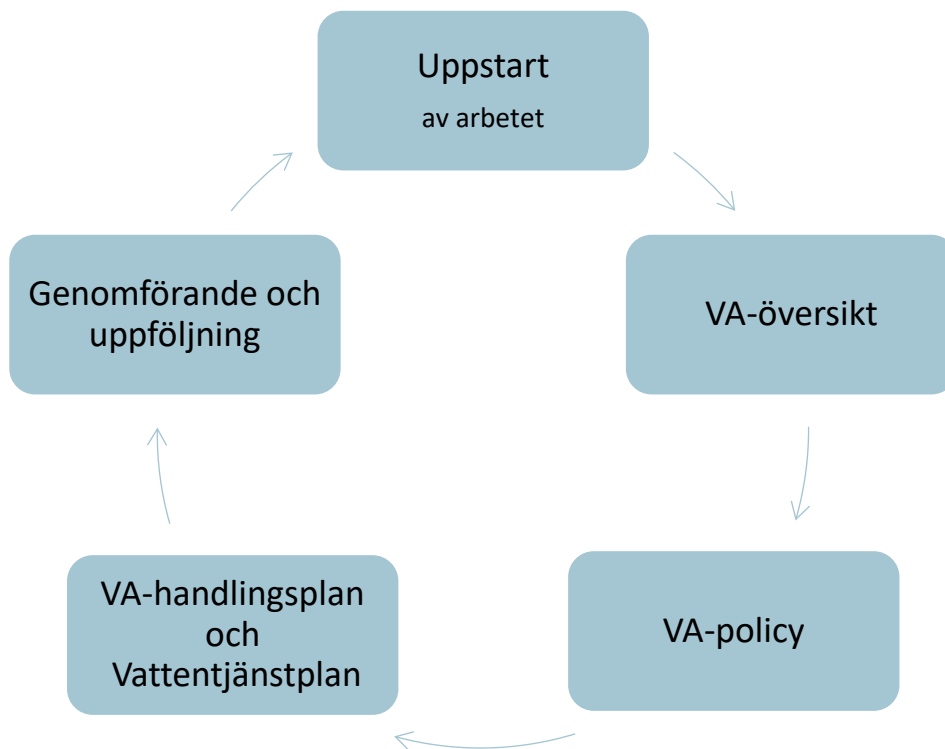

Figur 1. Stegen i en strategisk VA-plan enligt Hav:s vägledning (inklusive Vattentjänstplanen).

VA-planen med dess olika delar fungerar som styrdokument och beskriver hur Stenungsund ska lösa VA-försörjningen både inom och utanför kommunalt verksamhetsområde. Med hjälp av VA-planen skapas en helhetsbild av VA-försörjningen i hela kommunen. Åtgärdsbehovet definieras vilket möjliggör en långsiktig ekonomisk planering.

VA-handlingsplanens tre fokusområden listas nedan:



Figur 2. VA-handlingsplanens tre fokusområden

### 1.1.3 Identifierade utmaningar enligt VA-översikten

Nedan ges en kortfattad summering av de utmaningar som identifierats i kommunens VA-översikt:

- Att uppnå god status i samtliga vattenförekomster i enlighet med Vattendirektivet.
- Säkerställa att vattenskyddsområden motsvarar skyddsbehovet för kommunens vattenresurser.
- Hantering av den yttre hotbilden mot vattenförsörjningen samt informationssäkerhet vid behandling av kartunderlag.
- Säkerställa att kommunens vattenförsörjning är långsiktig och hållbar.
- Att säkerställa kommunens tillgång till råvattenuttag.
- Hantera den höga belastningen till reningsverken och den höga andelen tillskottsvatten i ledningsnätet.
- Tydliggöra ansvarsfördelningen kring kommunens uppströmsarbete.
- De allmänna ledningssystemen är gamla och är inte dimensionerade för framtida utbyggnad vilket behöver hanteras genom en långsiktig och hållbar plan för drift, underhåll och förnyelse.
- Att minska läckaget av dricksvatten i ledningsnätet.
- Att statusen på dagvattensystemet är oklar och att det sannolikt förekommer kapacitetsbrist.
- Oklar ansvarsfördelning för dag- och skyfallshantering vid planering, genomförande samt vid drift och underhåll.
- Det saknas en utbyggnadsplan för den allmänna VA-försörjningen och underlag för bedömning av vilka områden som är lämpliga för enskilt VA. Ett antal områden som är aktuella för exploatering är inte heller anslutna till det allmänna verksamhetsområdet för VA.
- Säkerställa att befintliga styrdokument aktualiseras kontinuerligt.

### 1.1.2 Målbild och ställningstaganden

I kommunens VA-policy framgår det att Stenungsunds arbete med VA-försörjning strävar efter att nå följande övergripande målbild:



Figur 2. Övergripande målbild för Stenungsunds VA-försörjning.

”VA-försörjningen i Stenungsund ska vara trygg, robust och hållbar över tid samt möjliggöra en hållbar utveckling i kommunen som helhet.

Det ska finnas en medvetenhet om vattnets värde och vad som är möjligt att göra för att bidra till en mer hållbar vattenanvändning.

Vatten är vårt viktigaste livsmedel. Därför ska Stenungsunds kommun arbeta för att samtliga invånare har tillgång till vatten av god kvalitet. VA-försörjningen ska utformas och skötas så att människors hälsa tryggas och att påverkan på miljön minimeras. Arbetet ska präglas av långsiktighet, tydlighet och transparens där det ska vara lätt att göra rätt, både för politiker och tjänstemän samt de som bor och verkar i kommunen.

Stenungsunds kommun ska arbeta för att nå god status i samtliga vattenförekomster i kommunen. Hav, sjöar och vattendrag ska präglas av ett rikt växt- och djurliv samt erbjuda goda möjligheter till rekreation.

Vattnet i Stenungsund är en värdefull resurs som ska respekteras när beslut ska fattas. Därför ska en långsiktigt hållbar vattenförvaltning med hänsyn till målbilden, framtida klimatförändringar och framtida samhällsutveckling tillämpas.”

Därtill finns 26 ställningstaganden som tydliggör hur kommunen ska arbeta långsiktigt i frågor kring VA-försörjning. Det finns ställningstaganden av övergripande karaktär samt



ställningstaganden för både allmän och enskilt dricks- och spillvattenförsörjning, samt dagvatten och skyfallshantering.

## 1.2 Metod och avgränsning

Arbetet med VA-handlingsplanen har letts av Sweco i samverkan med en förvaltningsövergripande arbetsgrupp på kommunen. Detta för att alla i kommunens organisation som är berörda av VA-försörjningsfrågor ska få möjlighet att påverka innehållet. Under arbetet hölls workshoppar och arbetsmöten med arbetsgruppen. Behov och frågeställningar har förankrats även utanför arbetsgruppen, såväl bland tjänstepersoner (styrgruppen, se figur nedan) som i berörda politiska instanser.

Arbetets utgångspunkt har varit de befintliga underlag som funnits att tillgå samt det som arbetsgruppen presenterat vid workshops och arbetsmöten.

Projektorganisationen för VA-planen består av en styrgrupp och en arbetsgrupp med representanter från Stenungsunds kommun enligt tabellen nedan.

|                                                  |                                                          |                                          |
|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| <b>Arbetsgrupp</b>                               |                                                          |                                          |
| Lisa Chohan Strömner<br>Strategisk processledare | Pernilla Larsson<br>Exploateringsingenjör                | Erica Ottosson<br>Miljöinspektör         |
| Linnéa Skott<br>Planarkitekt                     | Torun Hultén<br>Planarkitekt                             | Linus Persson<br>Byggingpektör           |
| Maria Alm<br>Miljöstrateg                        | Victoria Lind Magnusson<br>Utvecklingsledare Natur Miljö | Linda Källfelt<br>Projektledare VA-drift |
| Johan Jillmyr<br>Enhetschef Teknik               | Mats Pettersson<br>Enhetschef Drift                      | Fredrik Johansson<br>VA-ingenjör         |
| <b>Styrgrupp</b>                                 |                                                          |                                          |
| Fredric Arpfjord<br>Sektorchef Samhällsbyggnad   | Camilla Svensson<br>Verksamhetschef Infrastruktur        |                                          |
| <b>Konsultstöd Sweco</b>                         |                                                          |                                          |
| Tove Lindfors<br>Uppdragsansvarig                | Karin Heimdal<br>VA-strateg                              |                                          |
| Sofia Refsnes<br>VA-strateg                      | Christina Wetterlundh<br>Specialist                      |                                          |


## 2 Åtgärder

Den strategiska VA-planeringen tydliggör grunden för hur kommunen ska kunna erbjuda sina invånare och verksamheter god service samt uppfylla kommunens skyldigheter för vatten- och avloppsförsörjning enligt gällande lagstiftning. I detta avsnitt beskrivs det övergripande åtgärdsbehovet för att uppnå en hållbar utveckling av VA-försörjningen i kommunen. Handlingsplanens åtgärder beskriver det som bedöms vara mest angeläget ur ett förvaltningsövergripande perspektiv för att uppnå målbilden och arbeta enligt VA-policyns ställningstaganden.

På de workshopar som ligger till grund för handlingsplanen har ett resonemang förts om att de effektivaste åtgärderna som ger mest nytta ska genomföras. Utgångspunkten har varit att prioritera åtgärder som minimerar riskerna för miljön, motverkar negativa effekter på ekologiska systemen. Även ekonomiska effekter och konsekvenser ska vägas in med ambitionen att uppnå en hållbar och cirkulär ekonomi.

Åtgärderna i VA-handlingsplanen berör flera olika delar av kommunens organisation och det förutsätts att respektive verksamhet kommer arbeta in dessa i sin verksamhetsplanering. Detta kommer kräva samarbete mellan olika delar i kommunens organisation. Huvuddelen av åtgärderna har operativ karaktär som ryms inom det arbete kommunens tjänstemän har mandat att driva, men det finns även åtgärder som påverkas av kommunens politiska inriktning.

Åtgärderna har kategoriserats enligt Figur 3 och beskrivs i kapitel 0 till 0. Åtgärderna är sammanställda i Bilaga 1 där en grov tidplan och ansvarig funktion redovisas. Ansvaret för genomförande och uppföljning av åtgärder tillfaller olika enheter eller roller inom kommunens organisation. Även enheter som inte är huvudansvariga kan beröras och blir därmed medansvariga för att VA-planen ska kunna efterlevas. En tydlighet kring ansvarsfördelning idag och vid eventuella omorganisationer, är en förutsättning för ett effektivt arbete med VA-planens åtgärder.

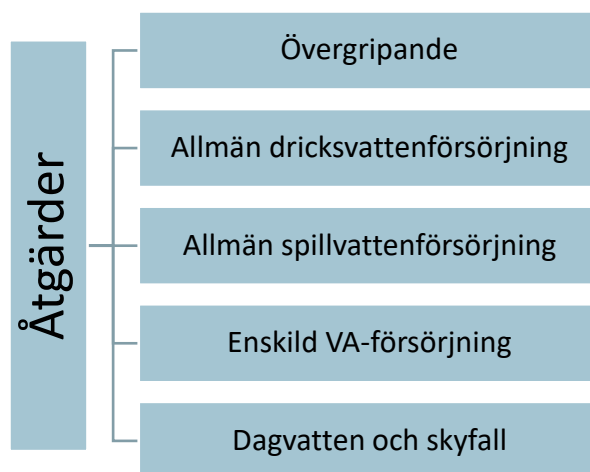

Figur 3. Kategorisering av åtgärder.

## 2.1 Övergripande

- Å1.** Skapa en förvaltningsövergripande VA-plangrupp för arbetet med VA-planen.
- Å2.** Formalisera VA-plangruppens arbetsuppgifter, resursbehov och ansvarsfördelning.
- Å3.** Ta fram en kommunikationsplan för VA-planeringen där det framgår vad som ska kommuniceras till vem och när det ska ske.
- Å4.** Uppdatera hemsidan och intranätet i enlighet med kommunikationsplanen.
- Å5.** Upprätta rutin för uppdatering av styrdokument kopplat till VA-planen så att dessa hålls aktuella och harmoniserar med varandra.

Genom tydliga kommunikationsvägar, en god politisk förankring och långsiktiga planer för kommunens VA-försörjning läggs grunden till en väl fungerande och effektiv samhällsbyggnadsprocess. För att åstadkomma detta krävs tydliga styrdokument som harmoniserar med varandra, tydlig ansvarsfördelning och en god samordning mellan enheter. Ett steg i denna riktning är den genomförda rekryteringen av en strategisk processledare inom Infrastruktur som kommer att ansvara för VA-planens implementering och därmed samordna arbetet med Å5. Även formalisering av en förvaltningsövergripande VA-plangrupp (Å1 och Å2) är en viktig pusselbit för att uppnå ett effektivt arbetssätt och en god kommunikation mellan berörda enheter. Utöver en bred representation behövs tydliga beskrivningar och rutiner för arbetsuppgifter, ansvarsfördelning, mandat och kommunikationsvägar. VA-plangruppen bör även arbeta med att genomföra åtgärder i enlighet med kommunikationsplanen (Å3, Å4 och Å13), dvs hur olika insatser ska ske och när samt vilket budskap som ska delges olika målgrupper.

- Å6.** Genomför årlig översyn av VA-taxan.
- Å7a.** Ta fram en långsiktig plan för förnyelse med beslutad förnyelsetakt för kommunens ledningsnät.
- Å7b.** Ta fram en plan för drift och underhåll för att säkerställa hållbar drift och identifiera behov av resurser

Att eftersträva en hållbar taxeutveckling samt att analysera åtgärders kostnader i förhållande till nytta bidrar till att skapa ett effektivt arbetssätt där resurser nyttjas på ett så hållbart sätt som möjligt. Det möjliggör en ekonomi i balans över tid där budgeten ligger i fas. En årlig översyn av taxan bör göras med en tidshorisont på tre år och kopplas till både drifts- och investeringsbudget (Å6).

För att säkerställa VA-försörjningens funktion och för att kunna möta framtida krav ska kommunen ta fram en långsiktig plan för förnyelse (Å7a) samt en plan för drift och underhåll (Å7b). Detta bidrar till mer fokus på planerat underhåll och mindre tid för akuta insatser inom driften. Behovet av reinvesteringar i befintlig infrastruktur i kombination med framtida investeringar på grund av nya krav och utbyggnad till fastigheter kommer tydliggöra vilken intern kapacitet som behövs inom kommunen (se kapitel 3 för vidare resonemang kring behov av personella resurser). Läcksökning (Å24) och modellering av det kommunala ledningsnätet (Å25) utgör betydelsefulla underlag vid framtagande av en dessa planer. Detsamma gäller

separering av dag- och spillvattennätet (Å32) samt åtgärdsplan för att minska andelen tillskottsvatten (Å31). Genomförandet av dessa åtgärder kan därför med fördel samordnas.

**Å8.** Upprätta en 10-årsplan för VA-utbyggnad (utifrån resultatet i Vattentjänstplanen).

**Å9.** Utbyggnad till VA-planområdena ska planeras, utredas och projekteras, därtill ska behovet av verksamhetsområde för dagvatten klargöras.

**Å10.** Genomför fördjupade utredningar av de VA-utredningsområden som identifierats i Vattentjänstplanen.

**Å11.** Genomför löpande aktualisering av klassningen av VA-planområden och kommunicera eventuella förändringar till berörda delar av kommunens organisation.

**Å12.** Ta fram rutiner åt berörda delar av kommunens organisation för att den ordinarie verksamheten ska beakta klassningen av VA-planområden.

**Å13.** Ta fram kommunikationsmaterial till VA-utbyggnadsområden och informera berörda.

I Vattentjänstplanen presenteras de områden till vilka allmän VA-försörjning bör byggas ut utifrån Lagen om allmänna vattentjänster (LAV). Dessa områden behöver utredas vidare utifrån befintliga förutsättningar och framtida planer (Å8-Å13). Att stämma av utbyggnad av VA-försörjning mot tänkt bebyggelseutveckling enligt översiktsplaner och planprogram är ett effektivt sätt att nyttja olika delar av samhällsbyggnadsprocessen, skapa en långsiktighet, hitta synergieffekter samt ta vara på utfört arbete och kompetens. Det skapar också en bra grund för en tydlig kommunikation gentemot allmänheten, till exempel gällande prioriteringar. När planer, ärenden och beslut kommuniceras, motiveras samt hanteras på ett tydligt och enhetligt sätt ger det förutsättningar för en ökad förståelse och acceptans. Därmed kan arbetet bedrivas mer effektivt.

**Å14.** Ta fram en kommunövergripande recipientklassning som identifierar recipienternas känslighet.

**Å15.** Upprätta lokala åtgärdsprogram (LÅP) för kommunens vattenförekomster och säkerställ att dessa integreras i samhällsbyggnadsprocessen.

Vatten har ett stort värde som dricksvattenresurs, för den biologiska mångfalden och för det rörliga friluftslivet. I Stenungsund finns hav, sjöar och vattendrag vilket gör detta värde särskilt stort. För att dessa värden ska kunna bevaras och utvecklas krävs ett långsiktigt arbete.

Kommunen ska ta fram en övergripande recipientklassning (Å14) som sammanställer den information som finns tillgängligt för recipienterna och vad för hänsyn som behöver visas för varje respektive recipient. Syftet är att få en översikt över värdena och känsligheten vilket kan ligga till grund för prioritering av åtgärder kopplat till exempelvis dagvatten, åtgärder kring tillskottsvatten och tillsyn av enskilda avlopp. Detta är ett betydelsefullt underlag för både genomförande av lokala åtgärdsprogram (Å15) samt för framtagande av dagvattenplan (Å38).

Enligt Vattendirektivet och Miljöbalken har kommunen en skyldighet att vidta de åtgärder som föreskrivs i Åtgärdsprogrammen samt att ta hänsyn till miljö kvalitetsnormerna (MKN) vid planläggning och andra ärenden (se Å16). För att kunna genomföra kostnadseffektiva lokala

åtgärder krävs ett lokalt underlag som beskriver var, hur, när, av vem och till vilken kostnad åtgärder ska genomföras. Detta görs genom att ta fram lokala åtgärdsprogram för kommunens avrinningsområden.

Exempel på åtgärder som minskar föroreningsbelastningen till kommunens recipienter och bidrar till förbättrad vattenkvalitet är VA-utbyggnad, fortsatt VA-sanering av ledningsnät och ökad tillsyn på enskilda avlopp. Det är även viktigt att ställa tydliga krav i tidiga skeden i planprocessen (både översiktsplan och detaljplan) som följs upp vid anläggning och drift. Kommunens vattenprovtagning är en viktig del i att bedöma nuvarande status och för att följa upp effekten av utförda åtgärder. Det är därmed av stor betydelse att pågående provtagning fortsätter.

**Å16.** Ta fram handläggarstöd för hantering av VA-försörjningen i samhällsbyggnadsprocessen.

**Å17.** Ta fram verksamhetsmål för VA-enheten.

**Å18a.** Skapa ett årshjul för VA-planeringsarbetet som samordnas med kommunens övriga planering.

**Å18b.** Årlig kontroll av kommande lagstiftning och krav kopplat till VA-försörjningen

För att uppnå en långsiktigt hållbar VA-försörjning behöver det finnas tydliga mål, rutiner och verktyg för att utveckla och implementera VA-planens förhållningssätt i kommunens vardagliga arbete. Tydliga stöd för handläggare i olika delar av samhällsbyggnadsprocessen, från strategisk planering till genomförande, bidrar till att skapa ett gemensamt arbetssätt och att förutsättningar för en god samordning mellan olika sektors arbete (Å16). Arbetet kan med fördel samordnas med arbetet att ta fram en dagvattenplan (Å36) då dessa har flertalet gemensamma beröringspunkter. Exempelvis omfattar en dagvattenplan bland annat dagvattenhanteringsroll i olika delar av samhällsbyggnadsprocessen.

**Å19.** Delta i utvecklingsprojekt kring cirkulär vattenanvändning tillsammans med industrin och RISE.

Vatten är snabbt på väg att bli en bristvara. Vatten står även i fokus för mål nummer sex bland de globala målen för hållbar utveckling. Det pågår standardiseringsarbete både i Sverige och internationellt när det gäller återanvändning av vatten. Att fler stora aktörer tar steget att bli vattenförvaltare är avgörande för att angripa vattenbristen. I Stenungsund är industrin en mycket stor förbrukare av råvatten. För att hitta mer effektiva sätt att använda kommunens vatten på initierade Stenungsunds kommun ett projekt kring cirkulär vattenanvändning tillsammans med industrin och RISE.

**Å20.** Uppföljning av åtgärdslista i framtagna Risk- och sårbarhetsanalys

**Å21.** Ta fram rutiner för god informationssäkerhet (t.ex. behandling av kartunderlag).

Säkerhetsläget i världen idag har ytterligare tydliggjort vikten av att skydda samhällsviktig verksamhet mot yttre hot av olika slag. Dricksvattenförsörjningen är ett exempel på en sådan verksamhet där det skulle bli stora konsekvenser för samhällets om den utsattes sabotage. Hur

dessa yttre hot ska hanteras för att säkra en god dricksvattenförsörjning behöver hanteras. Under 2023 togs en Risk- och sårbarhetsanalys fram för VA-verksamheten. Till denna finns en åtgärdslista som behöver genomföras och följas upp. Informationssäkerhet i samband med hantering av underlagsmaterial är också en viktig del för att säkerställa att det inte sprids på ett okontrollerat sätt och därmed bidrar till att öka risken för till exempel sabotage. Rutiner för hur hanteringen ska ske vid till exempel behandling av kartunderlag (Å21) skulle bidra till en ökad struktur i arbetet samt likartad ärendehantering.

## 2.2 Allmän VA-försörjning

### 2.2.1 Dricksvatten

Vatten är vårt viktigaste livsmedel. Vi är beroende av hälsosamt och rent vatten i tillräcklig mängd för att må bra. I kommunens översiktsplan anges att det kommer krävas mer råvatten och en ökad produktion av dricksvatten samt ett förstärkt ledningsnät. Utöver samarbetet med Kungälv och Tjörn finns det utifrån både kommunala och regionala underlag ett behov av att öka produktionen av dricksvatten för att öka redundansen och beredskapen i händelse av kris. I den regionala vattenförsörjningsplanen identifieras Stora Hällungen som en regionalt viktig vattenresurs. Även i åtgärdsprogrammet för Västerhavets vattendistrikt (2016–2021) ställs det krav på att kommunerna ska säkerställa ett långsiktigt skydd för nuvarande och framtida dricksvattenförsörjningen. I remisshandlingen för det nya åtgärdsprogrammet för Västerhavets vattendistrikt (2021–2027) redovisas också åtgärder som kommunen ska arbeta med kopplat till vattenförsörjning. Där framgår bland annat att kommunerna ska ha en sektorsövergripande plan för vattenanvändning i ett förändrat klimat som ska utgå från den regionala vattenförsörjningsplanen. Det betonas även att kommunen ska säkerställa ett långsiktigt skydd för den nuvarande och framtida dricksvattenförsörjning.

**Å22.** Upprätta en kommunal vattenförsörjningsplan som inkluderar möjligheter till regionalt samarbete för att uppnå en säker dricksvattenförsörjning.

**Å23.** Revidera vattenskyddsområden och för att säkerställa tillräckligt och långsiktigt skydd

**Å24.** Utför systematisk läcksökning och genomför åtgärder för att minska läckaget.

**Å25.** Ta fram rutin för fortsatt modellering av ledningsnät.

För att säkra tillgången till vatten i framtiden krävs en större kunskap om kommunens naturgivna förutsättningar, tillgången till vattenresurser samt framtida vattenbehov. Detta föreslås ingå i en vattenförsörjningsplan vars syfte är att säkerställa tillgången till vattenresurser på lång sikt för både kommunal och enskild dricksvattenförsörjning (Å22). Planen bör bland annat kunna utgöra ett underlag för att bedöma möjligheten att anordna enskild vatten i ett område, exempelvis vid ansökan om plan- eller förhandsbesked. Hänsyn bör även tas till annan vattenanvändning som till exempel bevattning och industriändamål vilket är en viktig faktor i Stenungsund då det, som tidigare nämnts, finns flertalet verksamheter i kommunen som förbrukar stora mängder vatten. Eftersom kommunen idag saknar

reservvattentäkt skulle även potentiella vattenresurser för detta ändamål med fördel kunna inkluderas i arbetet.

Tillgångarna kan därefter prioriteras, skyddas och synliggöras i den fysiska planeringen (Å23). Skyddsområden med tydliga föreskrifter styr vilken markanvändning som tillåts i området. Resultatet blir att långsiktig vattenkvalitet kan säkerställas i och med att marken inte får användas till något som påverkar täkten negativt.

En vattenförsörjningsplan som redovisar nuvarande och framtida behov av dricksvatten utgör även ett nödvändigt underlag för att beslutad vattendom och uttagsbehov ska harmonisera med varandra och att framtida behov därmed ska kunna mötas. Annars är risken att det i vissa områden inte finns möjlighet att tillgodose den dricksvattenmängd som efterfrågas. En del i detta arbete är också att utföra systematiska läcksökningar (Å24). Utläckage av vatten från ledningsnätet är den största ”konsumenten” av dricksvatten i delar av Stenungsund. Analys av åtgärdsbehov samt genomförande av effektiva åtgärder för att minska utläckaget från ledningsnätet blir därmed viktigt för att uppnå en mer hållbar användning av kommunens vatten. Detta är också en viktig del att inkludera i arbetet med en DUF-plan (Å7).

En strategisk och långsiktig plan för kommunens vattenförsörjning bidrar sammanfattningsvis till att skapa ett flergenerationsperspektiv där tillgången på dricksvatten säkerställs både för nuvarande och kommande invånare. Det ska fungera både till vardags och när störning av något slag uppstår.

**Å26.** Säkra möjligheten till vattenuttag genom att ansöka om tillstånd för vattenuttag för vattenverket i Svenshögen.

**Å27.** Ansöka om tillstånd för vattenuttag för vattenverket i Ucklum samt utreda kompletterande råvattenkällor.

**Å28a.** Stärka samverkan med Vattenfall för att säkra framtida vattenförsörjning.

**Å28b.** Ta fram förstudie för att utreda framtida vattenproduktion för Stenungsunds vattenverk

**Å29.** Kartlägg fördelning av vattendomen i Stora Hällungen för att se över möjlighet till ökad andel till kommunen.

Vattendorar anger hur vatten får tas ut från en vattentäkt, och hur mycket vatten som ska finnas i tækten. För att säkra möjligheten till vattenuttag för vattenverken i Ucklum och Svenshögen behöver kommunen ansöka om vattendorar av erforderlig storlek (Å26 och 27). Kompletterande råvattenkällor för att säkra vattentillgången i Ucklum behöver också kartläggas i samband med detta. För att säkra kommunens framtida vattenförsörjning behöver kommunen även stärka sin samverkan och dialog med Vattenfall (Å28a). En förstudie ska genomföras för att utreda framtida vattenproduktion för Stenungsunds vattenverk (Å28b). För att säkra vattentillgång på lång sikt behöver kommunen även kartlägga vattendomen från Stora Hällungen och de senare avtalen mellan kommunen, Vattenfall och industrierna som beskriver och fördelar uttagna vattenvolymer från Stora Hällungen. Möjligheter till ökad andel för kommunen ska ses över (Å29).



**Å30.** Ta fram aktivitetsplan för kommunikation om dricksvattenförsörjningen med brukare som målgrupp.

**Å31.** Uppdatera nödvattenplan samt identifiera reservvattenbehov

Vattenbrist riskerar att bli en av klimatförändringarnas mest påtagliga konsekvenser. Rent vatten är en förutsättning för att människor ska kunna leva ett gott liv. Samtidigt tas ofta tillgången till vatten för givet. För att kunna uppnå en mer hållbar vattenanvändning är kommunikation kring vattnets värde en viktig framgångsfaktor. Detta behöver ske på ett strukturerat sätt och anpassas till den tänkta målgruppen (Å30). Samordning med nationella insatser där det redan finns färdigt underlag med olika budskap, underlättar detta arbete.

Nödvatten är dricksvatten som distribueras på annat sätt än genom ledningsnätet. En genomarbetad nödvattenplan är ett verktyg för kommunen i arbetet att säkerställa en funktionell nödvattenförsörjning vid leveransavbrott från den ordinarie dricksvattenförsörjningen. Det är därmed en viktig del av kommunens samlade krisberedskap. För att säkerställa dess genomförbarhet behöver den hållas aktuell genom kontinuerlig uppdatering (Å31).

### 2.2.2 Spillvatten

**Å32.** Bedriva systematiskt arbete med separering av dag- och spillvatten.

**Å33.** Ta fram åtgärdsplan för att minska andelen tillskottsvatten.

**Å34.** Ta fram strategi för minskad bräddning vid Strävlidens reningsverk

**Å35.** Ta fram rutin och ansvarsfördelning för kommunens uppströmsarbete.

För att kunna möta framtida reningskrav, de utmaningar som klimatförändringarna innebär och samtidigt genomföra den planerade bebyggelseutvecklingen enligt översiktsplanen är det nödvändigt att arbeta strukturerat och ta fram en långsiktig plan för såväl VA-utbyggnad (Å8) som drift-, underhåll och förnyelse i den befintliga anläggningen (Å7). Att minska mängden tillskottsvatten i spillvattenledningarna är en viktig del i detta arbete (Å33). Det leder till minskad belastning på ledningar, pumpstationer och reningsverk. Då skapas förutsättningar för ytterligare avloppsanslutningar och bättre hushållning av energi och kemikalier i pumpar och reningsprocessen. Minskad andel tillskottsvatten leder till minskad risk för källaröversvämningar och bräddningar av orenat avloppsvatten till recipienten vilket ger förbättrad vattenkvalitet. En viktig del för att minska tillskottsvattnet är att arbeta systematiskt med att separera dag- och spillvattennätet.

För att kunna nå Vattendirektivets krav om god status i samtliga vattenförekomster samt uppnå de nationella miljömålen måste resurser avsättas för att minska utsläpp av näringsämnen och miljöskadliga ämnen till mark, luft och vatten. Uppströmsarbete kan minska gifterna i miljön och mängden skräp i spillvattensystemet. Det är viktigt då reningsverk ej är byggda för att ta hand om miljögifter. Bäst är om miljögifter och skräp från hushåll och industrier inte kommer ut i avloppssystemet överhuvudtaget. Det är både billigare, miljövänligare och enklare än att rena vattnet. Att ta fram en rutin för hur detta uppströmsarbete bör gå till, inklusive vem som



ansvarar för olika delar, är en del i att arbeta mot renare vatten och uppnå Vattendirektivets krav (Å35). Som komplement till en sådan rutin är det fördelaktigt att skapa ett bättre kunskapsunderlag kring känsligheten hos kommunens recipienter (se Å14).

## 2.3 Enskild VA-försörjning

**Å36.** Ta fram en plan för tillsyn av enskilda avlopp och fortsätta arbetet med inventering av dessa

För att uppnå kraven i Vattendirektivet krävs åtgärder för att bland annat minska mängden näringsämnen i avloppsvattnet. Stenungsund har inventerat de enskilda avlopp som finns i kommunen. Nästa steg är att ta fram en plan för tillsyn av enskilda avlopp (Å33) samt fortsätta arbetet med inventering av dessa. Den lägger grunden för att identifiera de områden där åtgärder behöver vidtas. I slutändan kan resultatet av detta arbete bidra till att de enskilda avloppen uppnår god funktion.

Kunskap om anläggningarnas status gör det lättare att planera och prioritera för eventuell kommunal anslutning av de enskilda avloppen. Fastighetsägaren får också, vid känd status, möjlighet att planera åtgärder för sin anläggning. Det blir en tydlighet i kommunikationen mellan kommunen och den enskilde vilket kan leda till en större trygghet för fastighetsägare utanför verksamhetsområden. Arbeta med plan för enskilt VA i väntan på VA-utbyggnad samt ersättningspolicy för dessa har tagits fram som separata dokument. Dessa riktlinjer syftar till att få en enhetlig grund för handläggning av enskilda avlopp i VA-utbyggnads-områden (områden där kommunen planerar att bygga ut den allmänna VA-anläggningen) samt minska risken för att fastighetsägare saknar rätt information inför investeringsbeslut gällande enskilda avloppsanläggningar och därigenom undvika ersättningsskyldighet för onyttigblivna enskilda avloppsanläggningar.

I den planerade rutinen för uppströmsarbete (Å34) finns det också möjligheter att inkludera arbete för att minska belastningen på näringsämnen från bland annat enskilda avlopp.

**Å37.** Identifiera vattentäkter som omfattas av livsmedelslagstiftningen och vid behov inrätta skyddsområden.

**Å38.** Ta fram en geohydrologisk undersökning.

Att i tidigt skede, till exempel i samband med att en ansökan om planbesked eller förhandsbesked inkommer, utreda förutsättningarna för VA-försörjningen i det aktuella området ger både kunskap och tydlighet i det fortsatta planarbetet. En geohydrologisk undersökning är ett viktigt underlag för att kunna uppnå detta (Å38). Det är viktigt att kartlägga vilka konsekvenser byggnation i området skulle kunna få och om det skulle fungera med enskild VA-försörjning eller om utbyggnad av det allmänna verksamhetsområdet skulle krävas. Om fastigheter med enskilt vatten får dålig dricksvattenkvalitet och/eller brist på vatten är risken att kommunen blir förelagd att utöka sitt verksamhetsområde dit. Kunskap gällande områden där behovet riskerar att överskrida tillgången är viktiga underlag för att kunna bedriva

ett strukturerat inventerings-, åtgärds- och utbyggnadsarbete i enlighet med VA-utbyggnadsplanen. I dessa områden bör inte heller ytterligare byggnation tillåtas utan att det finns en tydlig plan för vattenförsörjningen. Ett annat viktigt kunskapsunderlag i detta arbete är en inventering av dricksvattentäkter som omfattas av livsmedelslagstiftningen och vid behov inrätta skyddsområden för att säkerställa en långsiktig tillgång av dricksvatten av god kvalitet från dessa (Å37).

## 2.4 Dagvatten och skyfall

**Å39.** Ta fram en dagvattenplan

**Å40.** Ta fram skyfallsplan där lämpliga ytor för dagvatten- och skyfallsåtgärder identifieras och tydliggöra platser som är problematiska ur detta perspektiv

Kommunen ska ta fram en dagvattenplan i syfte att åstadkomma en hållbar dagvattenhantering (Å39). Eftersom dagvattenfrågan behöver hanteras övergripande i den kommunala samhällsplaneringen bör arbetet utföras tillsammans med en kommunal arbetsgrupp med representanter från berörda enheter. Åtgärden kan också med fördel samordnas med framtagande av handläggarstöd för samhällsbyggnadsprocessen (Å16) då de har flera gemensamma beröringspunkter.

Viktiga delar som ska ingå i dagvattenplanen är ansvarsfördelning, krav och riktlinjer kring rening och fördröjning av dagvatten. Planen ska även innehålla vägledning för hur dagvatten ska hanteras och inkluderas i olika delar av samhällsbyggnadsprocessen, från strategisk planering till drift och skötsel. Den otydliga lagstiftningen och ansvarsfördelningen kring dagvatten gör att det finns behov av processkartläggning som resulterar i checklistor där arbetsgången och ansvarsfördelningen blir tydlig. De behov som identifieras under arbetets gång ska sammanfattas i en åtgärdslista där ansvarig enhet och tidplan tydliggörs.

I arbetet med kommunens klimatanpassningsplan har bland annat behovet av en kommunal skyfallskartering blivit tydligt. Den ska kartlägga områden med risk för skadliga översvämningar som kan uppkomma då nederbörden överstiger kapaciteten i dagvattensystemet (Å40). Utifrån denna är det sedan möjligt att identifiera lämpliga åtgärder som ska genomföras för att minska riskerna och möjliggöra tänkt utveckling i enlighet med andra strategiska dokument. VA-handlingsplanen och klimatanpassningsplanen har även andra beröringspunkter som behöver samordnas vid genomförande av åtgärder.

Det ställs allt högre krav på kommunen i frågor kring skyfall. Enligt rekommendationer från Länsstyrelsen ska ny bebyggelse planeras så att den inte tar skada eller orsakar skada vid en översvämning från minst ett 100-årsregn. Risker för översvämning från ett 100-årsregn ska bedömas i detaljplan och eventuella skyddsåtgärder ska säkerställas. Bebyggelse som bedöms utgöra samhällsviktig verksamhet ska ges en högre säkerhetsnivå och planeras så att funktionen kan upprätthållas vid en översvämning. Även framkomligheten ska beaktas och vid behov säkerställas.

Proaktivt arbete med dagvatten- och skyfallshantering från tidiga skeden till genomförande, drift och uppföljning skapar möjlighet till ett större urval av åtgärder. Valmöjligheterna är ofta mer begränsade om åtgärder måste vidtas i senare skeden. Det är också en stor kostnadsskillnad mellan att förebygga och att åtgärda i efterhand.

## 3 Genomförande och uppföljning

### 3.1 Genomförande

Genomförande och uppföljning av åtgärder är det fjärde steget i HaV:s vägledning för arbete med en strategisk VA-plan (se Figur 1). Den största utmaningen i övergången från planeringsarbete till implementering är att göra planen operativ. Vattenplanering (åtgärd 1 i Åtgärdsprogrammet för Västerhavets vattendistrikt) är ett sammanfattande begrepp för den process där bland annat arbetet med den strategiska VA-planen ingår. Det finns goda förutsättningar att uppnå denna åtgärd i och med implementering av denna VA-plan samt genomförande av dess åtgärder.

VA-planen ska ligga till grund för, samt tydligt kunna kopplas till, respektive enhets verksamhetsplanering och budgetarbete i syfte att kunna gå från ord till handling. De åtgärder som presenteras i VA-handlingsplanen måste införlivas på ett verksamt sätt i kommunens dagliga arbete. I bilaga 1 Åtgärdslista framgår tidplan och huvudansvarig för att driva och finansiera åtgärden. Där tydliggörs också vilka andra funktioner som ska medverka i arbetet utöver den som är drivande.

Personen med ansvar för samordning av de strategiska dokumenten tillsammans med den föreslagna VA-plangruppen får nyckelfunktioner i det operativa arbetet. Gruppens medlemmar behöver säkerställa att VA-planens målsättning, ställningstaganden och åtgärder implementeras och införlivas i kommunens dagliga arbete. Detta behöver göras kontinuerligt så att nyanställda får informationen tidigt i sin introduktion och befintlig personal får kontinuerligt repetition och kompetensutveckling.

Personal med rätt kompetens behövs för att kunna uppnå de olika verksamheternas mål och krav samt för att genomföra åtgärderna i denna handlingsplan. Tydliga rutiner skapar också grunden för ett effektivt arbete som resulterar i större nytta per insats. I Stenungsund finns det bland annat ett behov av en projektsamordnare vars uppgift skulle vara att arbeta för att skapa en gemensam helhetsbild gällande vilka projekt som bör prioriteras och samordnas så att det är tydligt vilka mål alla ska arbeta mot. Detta skulle bidra till att en effektiv projektplanering och prioritering kan bedrivas inom hela sektor Samhällsbyggnad. Denna samordnare skulle behöva jobba tätt med ledningsgruppen och stödja i styrning och ledning.

Eftersom dagvattenfrågan omfattar många olika kompetenser inom den kommunala organisationen blir ofta ansvarsfördelningen otydlig och föremål för diskussion. Därför är det

viktigt att skapa en kommunal organisation där just ansvarsfrågan, både i befintliga miljöer och vid nybyggnation, klargörs. Detta skapar tydlighet, både internt och externt, hur kommunen ska hantera dagvattenfrågorna. Det resulterar i sin tur i snabbare och effektivare hantering av ärenden. I Stenungsund finns det behov av att tillsätta en sådan sektorsövergripande resurs för att samordna arbetet.

Vidare är samverkan med andra kommuner mycket betydelsefullt, både för att möjliggöra kompetensutveckling genom erfarenhets- och kunskapsutbyte och för att minska sårbarheten i VA-försörjningen. Ett kontinuerligt arbete med fokus på behov av personella resurser samt kompetensutveckling för att uppnå VA-planens mål, ställningstaganden och åtgärder, behöver bedrivas.

### **3.2 Uppföljning**

VA-planeringen behöver följas upp löpande och dokumenten behöver uppdateras vid behov för att kommunen ska få full utdelning av det arbete som lagts ned samt för att få ett så gott stöd som möjligt för det fortsatta arbetet. Den föreslagna VA-plangruppen och den funktion som beslutas vara sammankallande för gruppen är ansvarig för uppföljning av det samlade VA-planarbetet. Gruppen föreslås utgöra ett forum där frågor gällande VA-försörjning inom kommunen kan diskuteras. Förslagsvis har gruppen fasta återkommande möten men kan också sammankallas vid behov.

VA-plangruppen bör kontinuerligt diskutera behov av att uppdatera innehållet i VA-handlingsplanen och Vattentjänstplanen, speciellt i samband med planering av framtida bebyggelse. Målet är att se över VA-planen en gång per mandatperiod. Det görs med fördel i samband att ta fram en ny planeringsstrategi/översiktsplan. VA-plangruppens medlemmar ska utifrån gemensamma diskussioner genomföra revideringar av VA-handlingsplanens innehåll.

En viktig del i samarbetet kring VA-frågor är att informera övriga enheter om pågående eller utförda åtgärder enligt VA-handlingsplanen samt att inhämta varandras kunskap kring åtgärdernas beröringspunkter med andra enheter. Respektive enhet inom kommunen som har ansvar för genomförandet av VA-planens åtgärder är också ansvarig för uppföljningen av dessa åtgärder.

| Åtgärd                                                                                                                                | Slutfört | Pågående | 2024 | 2025–<br>2030 | 2031–<br>2040 | Löpande | Omfattning                                 | Budget                     | Ansvarig                                                                           | Medverkande                                                                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|------|---------------|---------------|---------|--------------------------------------------|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| <b>Övergripande</b>                                                                                                                   |          |          |      |               |               |         |                                            |                            |                                                                                    |                                                                             |
| Å1. Skapa en förvaltningsövergripande VA-plangrupp för arbetet med VA-planen                                                          |          | x        |      |               |               |         | Inom ordinarie arbetsuppgifter             | Inom befintlig driftbudget | Infrastruktur/Strategisk processledare                                             | VA-plangrupp                                                                |
| Å2. Formalisera VA-plangruppens arbetsuppgifter, resursbehov och ansvarsfördelning                                                    |          | x        |      |               |               |         | Inom ordinarie arbetsuppgifter             | Inom befintlig driftbudget | Infrastruktur/Strategisk processledare                                             | VA-plangrupp, Kommunikation och samordning/Utredare                         |
| Å3. Ta fram en kommunikationsplan för VA-planeringen där det framgår vad som ska kommuniceras till vem och när det ska ske            |          |          | x    |               |               |         | Inom ordinarie arbetsuppgifter             | Inom befintlig driftbudget | Infrastruktur/Strategisk processledare                                             | VA-plangrupp, Kommunaktionsenheten, Infrastruktur/Administrativ handläggare |
| Å4. Uppdatera hemsidan och intranätet i enlighet med kommunikationsplanen                                                             |          |          | x    |               |               | x       | Inom ordinarie arbetsuppgifter             | Inom befintlig driftbudget | Infrastruktur/Administrativ handläggare, Kommunikation och samordning/Kommunikatör | Infrastruktur/Strategisk processledare                                      |
| Å5. Upprätta rutin för uppdatering av styrdokument, kopplat till VA-planen, så att dessa hålls aktuella och harmoniserar med varandra | x        |          |      |               |               | x       | Inom ordinarie arbetsuppgifter             | Inom befintlig driftbudget | Infrastruktur/Strategisk processledare                                             | Kommunikation och samordning/Utredare och utvecklingsledare                 |
| Å6. Genomför årlig översyn av VA-taxan                                                                                                |          |          |      |               |               | x       | Inom ordinarie arbetsuppgifter             | Inom befintlig driftbudget | Infrastruktur-Teknik/Enhetschef                                                    | Infrastruktur/Verksamhetschef                                               |
| Å7a. Ta fram en långsiktig plan för förnyelse med beslutad förnyelsetakt för kommunens ledningsnät.                                   |          | x        | x    |               |               | x       | Delvis konsultstöd<br>Ca 100 000           | Inom befintlig driftbudget | Infrastruktur-Teknik/VA-ingenjör                                                   | Infrastruktur-Drift                                                         |
| Å7b. Ta fram en plan för drift och underhåll för att säkerställa hållbar drift och identifiera behov av resurser                      |          |          | x    |               |               |         | Delvis konsultstöd<br>Ca 100 000 – 200 000 | Inom befintlig driftbudget | Infrastruktur-Teknik/VA-ingenjör                                                   | Infrastruktur-Drift                                                         |
| Å8. Upprätta en 10-årsplan för VA-utbyggnad (utifrån resultatet i Vattentjänstplanen)                                                 |          | x        | x    |               |               |         | Inom ordinarie arbetsuppgifter             | Inom befintlig driftbudget | Infrastruktur/Strategisk processledare                                             | VA-plangrupp                                                                |

| Åtgärd                                                                                                                                                    | Slutfört | Pågående | 2024 | 2025–<br>2030 | 2031–<br>2040 | Löpande | Omfattning                                                  | Budget                           | Ansvarig                                                                               | Medverkande                                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|------|---------------|---------------|---------|-------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Övergripande</b>                                                                                                                                       |          |          |      |               |               |         |                                                             |                                  |                                                                                        |                                                                                                |
| Å9. Utbyggnad till VA-planområdena ska planeras, utredas och projekteras, därtill ska behovet av verksamhetsområde för dagvatten klargöras.               |          |          |      |               |               | x       | Ev konsultstöd<br>ca 100 000-150 000<br>kr/utredningsområde | Inom befintlig<br>driftbudget    | Utredning - Infrastruktur-Teknik/VA-<br>ingenjör<br><br>Projektering - Projektkontoret | Bygg och Miljö/Miljöinspektör                                                                  |
| Å10. Genomför fördjupade utredningar av de VA-utredningsområden som identifierats i Vattentjänstplanen                                                    |          |          |      |               |               | x       | Ev konsultstöd<br>ca 100 000-150 000<br>kr/utredningsområde | Inom befintlig<br>driftbudget    | Infrastruktur/Strategisk processledare                                                 | Bygg och Miljö/Miljöinspektör                                                                  |
| Å11. Genomför löpande aktualisering av klassningen av VA-planområden och kommunicera eventuella förändringar till berörda delar av kommunens organisation |          |          |      |               |               | x       | Inom ordinarie<br>arbetsuppgifter                           | Inom befintlig<br>driftbudget    | Infrastruktur/Strategisk processledare                                                 | VA-plangrupp                                                                                   |
| Å12. Ta fram rutiner åt berörda delar av kommunens organisation för att den ordinarie verksamheten ska beakta klassningen av VA-planområden               |          |          | x    |               |               |         | Inom ordinarie<br>arbetsuppgifter                           | Inom befintlig<br>driftbudget    | Infrastruktur/Strategisk processledare                                                 | VA-plangrupp                                                                                   |
| Å13. Ta fram kommunikationsmaterial till VA-utbyggnadsområden och informera berörda                                                                       |          | x        | x    |               |               |         | Inom ordinarie<br>arbetsuppgifter                           | Inom befintlig<br>driftbudget    | Infrastruktur/Administrativ handläggare                                                | Infrastruktur/Strategisk processledare,<br>Kommunikationsenheten                               |
| Å14. Ta fram en kommunövergripande recipientklassning som identifierar recipienternas känslighet.                                                         | x        |          |      |               |               |         |                                                             |                                  | Kommunikation och samordning/Utvecklingsledare natur och miljö, Miljöstrateg           | Infrastruktur/Strategisk processledare, Bygg och Miljö, Kommunikation och samordning/8+fjordar |
| Å15. Upprätta lokala åtgärdsprogram (LÅP) för kommunens vattenförekomster och säkerställ att dessa integreras i samhällsbyggnadsprocessen.                |          |          | x    | x             | x             |         | Ca 400 000-700 000<br>kr/recipient                          | Behov av extra medel i<br>budget | Kommunikation och samordning/Utvecklingsledare natur och miljö, Miljöstrateg           | Infrastruktur/Strategisk processledare, Bygg och Miljö, Kommunikation och samordning/8+fjordar |
| Å16. Ta fram handläggarstöd för hantering av VA-försörjningen i samhällsbyggnadsprocessen                                                                 |          | x        |      |               |               | x       | Inom ordinarie<br>arbetsuppgifter                           | Inom befintlig<br>driftbudget    | Infrastruktur                                                                          | VA-plangrupp                                                                                   |
| Å17. Ta fram verksamhetsmål för VA-verksamheten.                                                                                                          |          |          |      |               |               | x       | Inom ordinarie<br>arbetsuppgifter                           | Inom befintlig<br>driftbudget    | Infrastruktur/-Verksamhetschef<br>Enhetschef Teknik---- Enhetschef Drift               | Kommunikation och samordning                                                                   |

| Åtgärd                                                                                                                                               | Slutfört         | Pågående | 2024 | 2025–<br>2030 | 2031–<br>2040 | Löpande | Omfattning                                | Budget                                        | Ansvarig                                                    | Medverkande                                                                                                               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------|------|---------------|---------------|---------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Övergripande</b>                                                                                                                                  |                  |          |      |               |               |         |                                           |                                               |                                                             |                                                                                                                           |
| Å18a. Skapa ett årshjul för VA-planeringsarbetet som samordnas med kommunens övriga planering.                                                       |                  |          |      |               |               | x       | Inom ordinarie arbetsuppgifter            | Inom befintlig driftbudget                    | Infrastruktur/Strategisk processledare                      | VA-plangrupp                                                                                                              |
| Å18b. Årlig kontroll av kommande lagstiftning och krav kopplat till VA-försörjningen                                                                 |                  |          |      |               |               | x       | Inom ordinarie arbetsuppgifter            | Inom befintlig driftbudget                    | Infrastruktur/Strategisk processledare                      | Infrastruktur/Verksamhetschef, Infrastruktur-Teknik, Infrastruktur-Drift                                                  |
| Å19. Delta i utvecklingsprojekt kring cirkulär vattenanvändning tillsammans med industrin och RISE.                                                  | x                |          |      |               |               |         |                                           |                                               | Infrastruktur/Strategisk processledare                      | Infrastruktur/Verksamhetschef                                                                                             |
| Å20. Uppföljning av åtgärdslista i framtagna Risk- och sårbarhetsanalys                                                                              |                  |          | x    |               |               | x       | Kostnader specificerade i RSA:n           | Inom befintlig budget samt investeringsbudget | Infrastruktur/<br>- Enhetschef Teknik<br>- Enhetschef Drift | Infrastruktur/Verksamhetschef, Infrastruktur-Teknik, Infrastruktur-Drift                                                  |
| Å21. Ta fram rutiner för god informationssäkerhet (t.ex. behandling av kartunderlag).                                                                |                  | x        | x    |               |               |         | Inom ordinarie arbetsuppgifter            | Inom befintlig driftbudget                    | Infrastruktur/<br>- Enhetschef Teknik<br>- Enhetschef Drift | Infrastruktur-Teknik/<br>Infrastruktur-Drift/<br>Kommunikation och samordning/<br>Utvecklingsledare<br>GIS Digitalisering |
| <b>Allmän dricksvattenförsörjning</b>                                                                                                                |                  |          |      |               |               |         |                                           |                                               |                                                             |                                                                                                                           |
| Å22. Upprätta en kommunal vattenförsörjningsplan som inkluderar möjligheter till regionalt samarbete för att uppnå en säker dricksvattenförsörjning. |                  |          |      | x             |               |         | Ca 200 000-300 000 kr                     | Inom befintlig driftbudget                    | Infrastruktur/Strategisk processledare                      | Bygg och Miljö/Miljö, Infrastruktur-Drift                                                                                 |
| Å23. Revidera vattenskyddsområden för att säkerställa tillräckligt och långsiktigt skydd                                                             | Översyn slutförd |          | x    | x             |               |         | Ca 200 000 – 400 000 / vattenskyddsområde | Inom befintlig driftbudget                    | Infrastruktur/Strategisk processledare                      | Infrastruktur-Teknik, Infrastruktur-Drift, Bygg och Miljö/Miljö, Kommunikation och samordning/<br>Utvecklingsledare       |
| Å24. Utför systematisk läcksökning och genomför åtgärder för att minska läckaget.                                                                    |                  |          |      |               |               | x       | Inom ordinarie arbetsuppgifter            | Inom befintlig driftbudget                    | Infrastruktur-Drift                                         | Infrastruktur-Teknik                                                                                                      |



| Åtgärd                                                                                                             | Slutfört | Pågående | 2024 | 2025–<br>2030 | 2031–<br>2040 | Löpande | Omfattning                            | Budget                                                            | Ansvarig                                                                    | Medverkande                                                                                                                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|------|---------------|---------------|---------|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Allmän dricksvattenförsörjning</b>                                                                              |          |          |      |               |               |         |                                       |                                                                   |                                                                             |                                                                                                                            |
| Å25. Ta fram rutin för fortsatt modellering av ledningsnät                                                         |          | x        | x    |               |               |         | Inom ordinarie arbetsuppgifter        | Inom befintlig driftbudget                                        | Infrastruktur -Teknik/VA-ingenjör                                           |                                                                                                                            |
| Å26. Säkra möjligheten till vattenuttag genom att ansöka om tillstånd till vattenverken i Svenshögen.              |          |          | x    | x             |               |         | Ca 1 000 000 kr                       | Behov av ytterligare medel i drift- eller investeringsbudget      | Infrastruktur/Strategisk processledare                                      | Infrastruktur-Teknik/Infrastruktur-Drift, Infrastruktur-Teknik/VA-ingenjör                                                 |
| Å27. Ansöka om tillstånd för vattenuttag för vattenverket i Uecklum samt utreda kompletterande råvattenkällor      |          | x        | x    | x             |               |         | Ca 1 000 000 kr<br>2024 ca 500 000 kr | Behov av ytterligare medel i drift- eller investeringsbudget 2025 | Infrastruktur/Strategisk processledare                                      | Infrastruktur-Teknik/Infrastruktur-Drift, Infrastruktur-Teknik/VA-ingenjör                                                 |
| Å28a. Stärka samverkan med Vattenfall för att säkra framtida vattenförsörjning.                                    |          | x        | x    |               |               |         | Inom ordinarie arbetsuppgifter        | Inom befintlig driftbudget                                        | Infrastruktur/Verksamhetschef                                               | Infrastruktur/Strategisk processledare, Kommundirektör, Sektorchef Samhällsbyggnad                                         |
| Å28b. Ta fram förstudie för att utreda framtida vattenproduktion för Stenungsunds vattenverk                       |          |          | x    |               |               |         | Ca 450 000 kr                         | Inom befintlig driftbudget                                        | Infrastruktur/Strategisk processledare<br>Infrastruktur-Drift/Projektledare | Infrastruktur-Teknik/VA-ingenjör                                                                                           |
| Å29. Kartlägg fördelning av vattendomen i Stora Hällungen för att se över möjlighet till ökad andel till kommunen. |          | x        | x    |               |               |         | Inom ordinarie arbetsuppgifter        | Inom befintlig driftbudget                                        | Infrastruktur/Verksamhetschef                                               | Infrastruktur/Administrativ handläggare, Juriststöd                                                                        |
| Å30. Ta fram aktivitetsplan för kommunikation om dricksvattenförsörjningen med brukare som målgrupp                |          | x        | x    |               |               | x       | Inom ordinarie arbetsuppgifter        | Inom befintlig driftbudget                                        | Kommunikation och samordning/kommunikatör                                   | Infrastruktur/Strategisk processledare, Infrastruktur/Administrativ handläggare                                            |
| Å31. Uppdatera nödvattenplan samt identifiera reservvattenbehov                                                    |          |          | x    |               |               | x       | Ca 300 000 kr                         | Inom befintlig driftbudget                                        | Infrastruktur/Strategisk processledare                                      | Risk/Säkerhetssamordnare, Kommunikation och samordning/Kommunikatör, Infrastruktur/ Teknik och Drift, Bygg och Miljö/Miljö |



| Åtgärd                                                                                                                          | Slutfört | Pågående | 2024 | 2025–<br>2030 | 2031–<br>2040 | Löpande | Omfattning                                    | Budget                           | Ansvarig                                             | Medverkande                                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|------|---------------|---------------|---------|-----------------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| <b>Allmän spillvattenförsörjning</b>                                                                                            |          |          |      |               |               |         |                                               |                                  |                                                      |                                             |
| Å32. Bedriva systematiskt arbete med separering av dag- och spillvatten.                                                        |          |          |      |               |               | x       | Inom ordinarie arbetsuppgifter                | Inom befintlig driftbudget       | Infrastruktur-Teknik/VA-ingenjör                     | Infrastruktur-Drift                         |
| Å33. Ta fram åtgärdsplan för att minska andelen tillskottsvatten.                                                               |          | x        | x    |               |               |         | Inom ordinarie arbetsuppgifter                | Inom befintlig driftbudget       | Infrastruktur-Teknik/VA-ingenjör                     | Infrastruktur-Drift                         |
| Å34. Ta fram strategi för minskad bräddning vid Strävlidens reningsverk                                                         | x        |          |      |               |               |         |                                               |                                  | Infrastruktur-Teknik/VA-ingenjör/Infrastruktur-Drift |                                             |
| Å35. Ta fram rutin och ansvarsfördelning för kommunens uppströmsarbete.                                                         |          |          | x    |               |               |         | Inom ordinarie arbetsuppgifter                | Inom befintlig driftbudget       | Infrastruktur-Drift                                  | Infrastruktur-Teknik                        |
| <b>Enskild VA-försörjning</b>                                                                                                   |          |          |      |               |               |         |                                               |                                  |                                                      |                                             |
| Å36. Ta fram plan för tillsyn av enskilda avlopp samt fortsätta arbetet med inventering av dessa och tillsyn av enskilda avlopp |          |          |      |               |               | x       | Inom ordinarie tillsynsuppdrag                | Inom beslutad budget             | Bygg och Miljö/<br>avloppshandläggare                |                                             |
| Å37. Identifiera vattentäkter som omfattas av livsmedelslagstiftningen och vid behov inrätta skyddsområden                      |          | x        |      |               |               | x       | Inom ordinarie tillsynsuppdrag                | Inom beslutad budget             | Bygg och Miljö/<br>Miljö (Livsmedel)                 | Infrastruktur-Teknik                        |
| Å38. Ta fram en geohydrologisk undersökning                                                                                     |          |          |      | x             |               |         | Extern kompetens behövs men omfattning osäker | Extra medel behövs i driftbudget | Kommunikation och Samordning                         | Bygg och Miljö, Infrastruktur, Exploatering |

| Åtgärd                                                                                                                                                       | Slutfört | Pågående | 2024 | 2025–<br>2030 | 2031–<br>2040 | Löpande | Omfattning    | Budget                     | Ansvarig                                  | Medverkande                                                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|------|---------------|---------------|---------|---------------|----------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| <b>Dagvatten och skyfall</b>                                                                                                                                 |          |          |      |               |               |         |               |                            |                                           |                                                                    |
| Å39. Ta fram dagvattenplan                                                                                                                                   |          | x        | x    |               |               |         | Ca 400 000    | Inom befintlig driftbudget | Infrastruktur/Strategisk processledare    | VA-plangrupp                                                       |
| Å40. Ta fram skyfallsplan där lämpliga ytor för dagvatten- och skyfallsåtgärder identifieras och tydliggöra platser som är problematiska ur detta perspektiv |          | x        | x    | x             | x             |         | Ca 400 000 kr | Inom befintlig driftbudget | Kommunikation och Samordning/Miljöstrateg | Infrastruktur-Teknik, Exploatering/Mark- och exploateringsingenjör |

| Åtgärd                                                                                                                                | Slutfört | Pågående | 2024 | 2025–<br>2030 | 2031–<br>2040 | Löpande | Omfattning                                 | Budget                     | Ansvarig                                                                           | Medverkande                                                                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|------|---------------|---------------|---------|--------------------------------------------|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| <b>Övergripande</b>                                                                                                                   |          |          |      |               |               |         |                                            |                            |                                                                                    |                                                                             |
| Å1. Skapa en förvaltningsövergripande VA-plangrupp för arbetet med VA-planen                                                          |          | x        |      |               |               |         | Inom ordinarie arbetsuppgifter             | Inom befintlig driftbudget | Infrastruktur/Strategisk processledare                                             | VA-plangrupp                                                                |
| Å2. Formalisera VA-plangruppens arbetsuppgifter, resursbehov och ansvarsfördelning                                                    |          | x        |      |               |               |         | Inom ordinarie arbetsuppgifter             | Inom befintlig driftbudget | Infrastruktur/Strategisk processledare                                             | VA-plangrupp, Kommunikation och samordning/Utredare                         |
| Å3. Ta fram en kommunikationsplan för VA-planeringen där det framgår vad som ska kommuniceras till vem och när det ska ske            |          |          | x    |               |               |         | Inom ordinarie arbetsuppgifter             | Inom befintlig driftbudget | Infrastruktur/Strategisk processledare                                             | VA-plangrupp, Kommunaktionsenheten, Infrastruktur/Administrativ handläggare |
| Å4. Uppdatera hemsidan och intranätet i enlighet med kommunikationsplanen                                                             |          |          | x    |               |               | x       | Inom ordinarie arbetsuppgifter             | Inom befintlig driftbudget | Infrastruktur/Administrativ handläggare, Kommunikation och samordning/Kommunikatör | Infrastruktur/Strategisk processledare                                      |
| Å5. Upprätta rutin för uppdatering av styrdokument, kopplat till VA-planen, så att dessa hålls aktuella och harmoniserar med varandra | x        |          |      |               |               | x       | Inom ordinarie arbetsuppgifter             | Inom befintlig driftbudget | Infrastruktur/Strategisk processledare                                             | Kommunikation och samordning/Utredare och utvecklingsledare                 |
| Å6. Genomför årlig översyn av VA-taxan                                                                                                |          |          |      |               |               | x       | Inom ordinarie arbetsuppgifter             | Inom befintlig driftbudget | Infrastruktur-Teknik/Enhetschef                                                    | Infrastruktur/Verksamhetschef                                               |
| Å7a. Ta fram en långsiktig plan för förnyelse med beslutad förnyelsetakt för kommunens ledningsnät.                                   |          | x        | x    |               |               | x       | Delvis konsultstöd<br>Ca 100 000           | Inom befintlig driftbudget | Infrastruktur-Teknik/VA-ingenjör                                                   | Infrastruktur-Drift                                                         |
| Å7b. Ta fram en plan för drift och underhåll för att säkerställa hållbar drift och identifiera behov av resurser                      |          |          | x    |               |               |         | Delvis konsultstöd<br>Ca 100 000 – 200 000 | Inom befintlig driftbudget | Infrastruktur-Teknik/VA-ingenjör                                                   | Infrastruktur-Drift                                                         |
| Å8. Upprätta en 10-årsplan för VA-utbyggnad (utifrån resultatet i Vattentjänstplanen)                                                 |          | x        | x    |               |               |         | Inom ordinarie arbetsuppgifter             | Inom befintlig driftbudget | Infrastruktur/Strategisk processledare                                             | VA-plangrupp                                                                |

| Åtgärd                                                                                                                                                    | Slutfört | Pågående | 2024 | 2025–2030 | 2031–2040 | Löpande | Omfattning                                            | Budget                        | Ansvarig                                                                       | Medverkande                                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|------|-----------|-----------|---------|-------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Övergripande</b>                                                                                                                                       |          |          |      |           |           |         |                                                       |                               |                                                                                |                                                                                                |
| Å9. Utbyggnad till VA-planområdena ska planeras, utredas och projekteras, därtill ska behovet av verksamhetsområde för dagvatten klargöras.               |          |          |      |           |           | x       | Ev konsultstöd ca 100 000-150 000 kr/utredningsområde | Inom befintlig driftbudget    | Utredning - Infrastruktur-Teknik/VA-ingenjör<br>Projektering - Projektkontoret | Bygg och Miljö/Miljöinspektör                                                                  |
| Å10. Genomför fördjupade utredningar av de VA-utredningsområden som identifierats i Vattentjänstplanen                                                    |          |          |      |           |           | x       | Ev konsultstöd ca 100 000-150 000 kr/utredningsområde | Inom befintlig driftbudget    | Infrastruktur/Strategisk processledare                                         | Bygg och Miljö/Miljöinspektör                                                                  |
| Å11. Genomför löpande aktualisering av klassningen av VA-planområden och kommunicera eventuella förändringar till berörda delar av kommunens organisation |          |          |      |           |           | x       | Inom ordinarie arbetsuppgifter                        | Inom befintlig driftbudget    | Infrastruktur/Strategisk processledare                                         | VA-plangrupp                                                                                   |
| Å12. Ta fram rutiner åt berörda delar av kommunens organisation för att den ordinarie verksamheten ska beakta klassningen av VA-planområden               |          |          | x    |           |           |         | Inom ordinarie arbetsuppgifter                        | Inom befintlig driftbudget    | Infrastruktur/Strategisk processledare                                         | VA-plangrupp                                                                                   |
| Å13. Ta fram kommunikationsmaterial till VA-utbyggnadsområden och informera berörda                                                                       |          | x        | x    |           |           |         | Inom ordinarie arbetsuppgifter                        | Inom befintlig driftbudget    | Infrastruktur/Administrativ handläggare                                        | Infrastruktur/Strategisk processledare, Kommunikationsenheten                                  |
| Å14. Ta fram en kommunövergripande recipientklassning som identifierar recipienternas känslighet.                                                         | x        |          |      |           |           |         |                                                       |                               | Kommunikation och samordning/Utvecklingsledare natur och miljö, Miljöstrateg   | Infrastruktur/Strategisk processledare, Bygg och Miljö, Kommunikation och samordning/8+fjordar |
| Å15. Upprätta lokala åtgärdsprogram (LÅP) för kommunens vattenförekomster och säkerställ att dessa integreras i samhällsbyggnadsprocessen.                |          |          | x    | x         | x         |         | Ca 400 000-700 000 kr/recipient                       | Behov av extra medel i budget | Kommunikation och samordning/Utvecklingsledare natur och miljö, Miljöstrateg   | Infrastruktur/Strategisk processledare, Bygg och Miljö, Kommunikation och samordning/8+fjordar |
| Å16. Ta fram handläggartöd för hantering av VA-försörjningen i samhällsbyggnadsprocessen                                                                  |          | x        |      |           |           | x       | Inom ordinarie arbetsuppgifter                        | Inom befintlig driftbudget    | Infrastruktur                                                                  | VA-plangrupp                                                                                   |
| Å17. Ta fram verksamhetsmål för VA-verksamheten.                                                                                                          |          |          |      |           |           | x       | Inom ordinarie arbetsuppgifter                        | Inom befintlig driftbudget    | Infrastruktur/-Verksamhetschef<br>Enhetschef Teknik---- Enhetschef Drift       | Kommunikation och samordning                                                                   |

| Åtgärd                                                                                                                                               | Slutfört         | Pågående | 2024 | 2025–<br>2030 | 2031–<br>2040 | Löpande | Omfattning                                | Budget                                        | Ansvarig                                                    | Medverkande                                                                                                               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------|------|---------------|---------------|---------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Övergripande</b>                                                                                                                                  |                  |          |      |               |               |         |                                           |                                               |                                                             |                                                                                                                           |
| Å18a. Skapa ett årshjul för VA-planeringsarbetet som samordnas med kommunens övriga planering.                                                       |                  |          |      |               |               | x       | Inom ordinarie arbetsuppgifter            | Inom befintlig driftbudget                    | Infrastruktur/Strategisk processledare                      | VA-plangrupp                                                                                                              |
| Å18b. Årlig kontroll av kommande lagstiftning och krav kopplat till VA-försörjningen                                                                 |                  |          |      |               |               | x       | Inom ordinarie arbetsuppgifter            | Inom befintlig driftbudget                    | Infrastruktur/Strategisk processledare                      | Infrastruktur/Verksamhetschef, Infrastruktur-Teknik, Infrastruktur-Drift                                                  |
| Å19. Delta i utvecklingsprojekt kring cirkulär vattenanvändning tillsammans med industrin och RISE.                                                  | x                |          |      |               |               |         |                                           |                                               | Infrastruktur/Strategisk processledare                      | Infrastruktur/Verksamhetschef                                                                                             |
| Å20. Uppföljning av åtgärdslista i framtagna Risk- och sårbarhetsanalys                                                                              |                  |          | x    |               |               | x       | Kostnader specificerade i RSA:n           | Inom befintlig budget samt investeringsbudget | Infrastruktur/<br>- Enhetschef Teknik<br>- Enhetschef Drift | Infrastruktur/Verksamhetschef, Infrastruktur-Teknik, Infrastruktur-Drift                                                  |
| Å21. Ta fram rutiner för god informationssäkerhet (t.ex. behandling av kartunderlag).                                                                |                  | x        | x    |               |               |         | Inom ordinarie arbetsuppgifter            | Inom befintlig driftbudget                    | Infrastruktur/<br>- Enhetschef Teknik<br>- Enhetschef Drift | Infrastruktur-Teknik/<br>Infrastruktur-Drift/<br>Kommunikation och samordning/<br>Utvecklingsledare<br>GIS Digitalisering |
| <b>Allmän dricksvattenförsörjning</b>                                                                                                                |                  |          |      |               |               |         |                                           |                                               |                                                             |                                                                                                                           |
| Å22. Upprätta en kommunal vattenförsörjningsplan som inkluderar möjligheter till regionalt samarbete för att uppnå en säker dricksvattenförsörjning. |                  |          |      | x             |               |         | Ca 200 000-300 000 kr                     | Inom befintlig driftbudget                    | Infrastruktur/Strategisk processledare                      | Bygg och Miljö/Miljö, Infrastruktur-Drift                                                                                 |
| Å23. Revidera vattenskyddsområden för att säkerställa tillräckligt och långsiktigt skydd                                                             | Översyn slutförd |          | x    | x             |               |         | Ca 200 000 – 400 000 / vattenskyddsområde | Inom befintlig driftbudget                    | Infrastruktur/Strategisk processledare                      | Infrastruktur-Teknik, Infrastruktur-Drift, Bygg och Miljö/Miljö, Kommunikation och samordning/<br>Utvecklingsledare       |
| Å24. Utför systematisk läcksökning och genomför åtgärder för att minska läckaget.                                                                    |                  |          |      |               |               | x       | Inom ordinarie arbetsuppgifter            | Inom befintlig driftbudget                    | Infrastruktur-Drift                                         | Infrastruktur-Teknik                                                                                                      |

| Åtgärd                                                                                                             | Slutfört | Pågående | 2024 | 2025–<br>2030 | 2031–<br>2040 | Löpande | Omfattning                            | Budget                                                            | Ansvarig                                                                    | Medverkande                                                                                                                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|------|---------------|---------------|---------|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Allmän dricksvattenförsörjning</b>                                                                              |          |          |      |               |               |         |                                       |                                                                   |                                                                             |                                                                                                                            |
| Å25. Ta fram rutin för fortsatt modellering av ledningsnät                                                         |          | x        | x    |               |               |         | Inom ordinarie arbetsuppgifter        | Inom befintlig driftbudget                                        | Infrastruktur -Teknik/VA-ingenjör                                           |                                                                                                                            |
| Å26. Säkra möjligheten till vattenuttag genom att ansöka om tillstånd till vattenverken i Svenshögen.              |          |          | x    | x             |               |         | Ca 1 000 000 kr                       | Behov av ytterligare medel i drift- eller investeringsbudget      | Infrastruktur/Strategisk processledare                                      | Infrastruktur-Teknik/Infrastruktur-Drift, Infrastruktur-Teknik/VA-ingenjör                                                 |
| Å27. Ansöka om tillstånd för vattenuttag för vattenverket i Ucklum samt utreda kompletterande råvattenkällor       |          | x        | x    | x             |               |         | Ca 1 000 000 kr<br>2024 ca 500 000 kr | Behov av ytterligare medel i drift- eller investeringsbudget 2025 | Infrastruktur/Strategisk processledare                                      | Infrastruktur-Teknik/Infrastruktur-Drift, Infrastruktur-Teknik/VA-ingenjör                                                 |
| Å28a. Stärka samverkan med Vattenfall för att säkra framtida vattenförsörjning.                                    |          | x        | x    |               |               |         | Inom ordinarie arbetsuppgifter        | Inom befintlig driftbudget                                        | Infrastruktur/Verksamhetschef                                               | Infrastruktur/Strategisk processledare, Kommundirektör, Sektorchef Samhällsbyggnad                                         |
| Å28b. Ta fram förstudie för att utreda framtida vattenproduktion för Stenungsunds vattenverk                       |          |          | x    |               |               |         | Ca 450 000 kr                         | Inom befintlig driftbudget                                        | Infrastruktur/Strategisk processledare<br>Infrastruktur-Drift/Projektledare | Infrastruktur-Teknik/VA-ingenjör                                                                                           |
| Å29. Kartlägg fördelning av vattendomen i Stora Hällungen för att se över möjlighet till ökad andel till kommunen. |          | x        | x    |               |               |         | Inom ordinarie arbetsuppgifter        | Inom befintlig driftbudget                                        | Infrastruktur/Verksamhetschef                                               | Infrastruktur/Administrativ handläggare, Juriststöd                                                                        |
| Å30. Ta fram aktivitetsplan för kommunikation om dricksvattenförsörjningen med brukare som målgrupp                |          | x        | x    |               |               | x       | Inom ordinarie arbetsuppgifter        | Inom befintlig driftbudget                                        | Kommunikation och samordning/kommunikatör                                   | Infrastruktur/Strategisk processledare, Infrastruktur/Administrativ handläggare                                            |
| Å31. Uppdatera nödvattenplan samt identifiera reservvattenbehov                                                    |          |          | x    |               |               | x       | Ca 300 000 kr                         | Inom befintlig driftbudget                                        | Infrastruktur/Strategisk processledare                                      | Risk/Säkerhetssamordnare, Kommunikation och samordning/Kommunikatör, Infrastruktur/ Teknik och Drift, Bygg och Miljö/Miljö |

| Åtgärd                                                                                                                          | Slutfört | Pågående | 2024 | 2025–<br>2030 | 2031–<br>2040 | Löpande | Omfattning                                    | Budget                           | Ansvarig                                             | Medverkande                                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|------|---------------|---------------|---------|-----------------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| <b>Allmän spillvattenförsörjning</b>                                                                                            |          |          |      |               |               |         |                                               |                                  |                                                      |                                             |
| Å32. Bedriva systematiskt arbete med separering av dag- och spillvatten.                                                        |          |          |      |               |               | x       | Inom ordinarie arbetsuppgifter                | Inom befintlig driftbudget       | Infrastruktur-Teknik/VA-ingenjör                     | Infrastruktur-Drift                         |
| Å33. Ta fram åtgärdsplan för att minska andelen tillskottsvatten.                                                               |          | x        | x    |               |               |         | Inom ordinarie arbetsuppgifter                | Inom befintlig driftbudget       | Infrastruktur-Teknik/VA-ingenjör                     | Infrastruktur-Drift                         |
| Å34. Ta fram strategi för minskad bräddning vid Strävlidens reningsverk                                                         | x        |          |      |               |               |         |                                               |                                  | Infrastruktur-Teknik/VA-ingenjör/Infrastruktur-Drift |                                             |
| Å35. Ta fram rutin och ansvarsfördelning för kommunens uppströmsarbete.                                                         |          |          | x    |               |               |         | Inom ordinarie arbetsuppgifter                | Inom befintlig driftbudget       | Infrastruktur-Drift                                  | Infrastruktur-Teknik                        |
| <b>Enskild VA-försörjning</b>                                                                                                   |          |          |      |               |               |         |                                               |                                  |                                                      |                                             |
| Å36. Ta fram plan för tillsyn av enskilda avlopp samt fortsätta arbetet med inventering av dessa och tillsyn av enskilda avlopp |          |          |      |               |               | x       | Inom ordinarie tillsynsuppdrag                | Inom beslutad budget             | Bygg och Miljö/<br>avloppshandläggare                |                                             |
| Å37. Identifiera vattentäkter som omfattas av livsmedelslagstiftningen och vid behov inrätta skyddsområden                      |          | x        |      |               |               | x       | Inom ordinarie tillsynsuppdrag                | Inom beslutad budget             | Bygg och Miljö/<br>Miljö (Livsmedel)                 | Infrastruktur-Teknik                        |
| Å38. Ta fram en geohydrologisk undersökning                                                                                     |          |          |      | x             |               |         | Extern kompetens behövs men omfattning osäker | Extra medel behövs i driftbudget | Kommunikation och Samordning                         | Bygg och Miljö, Infrastruktur, Exploatering |

| Åtgärd                                                                                                                                                       | Slutfört | Pågående | 2024 | 2025–<br>2030 | 2031–<br>2040 | Löpande | Omfattning    | Budget                     | Ansvarig                                  | Medverkande                                                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|------|---------------|---------------|---------|---------------|----------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| <b>Dagvatten och skyfall</b>                                                                                                                                 |          |          |      |               |               |         |               |                            |                                           |                                                                    |
| Å39. Ta fram dagvattenplan                                                                                                                                   |          | x        | x    |               |               |         | Ca 400 000    | Inom befintlig driftbudget | Infrastruktur/Strategisk processledare    | VA-plangrupp                                                       |
| Å40. Ta fram skyfallsplan där lämpliga ytor för dagvatten- och skyfallsåtgärder identifieras och tydliggöra platser som är problematiska ur detta perspektiv |          | x        | x    | x             | x             |         | Ca 400 000 kr | Inom befintlig driftbudget | Kommunikation och Samordning/Miljöstrateg | Infrastruktur-Teknik, Exploatering/Mark- och exploateringsingenjör |
